Sigeplan

Baustelle: 05001 - Wohn- u. Geschäftshaus, Düsseldorf - Kurzestr. 5 - 7 - 40477 Düsseldorf

Gewerk	Gefährdungen,Einrichtungen	Lösungen,Maßnahmen	ausg. Lösungskonzepte	Regelwerk	Ord.-Nr.	Koordination ggS	Koordination ggB	Bestimmungen	Firma/Verantwortlicher	Datum von	Datum bis
Wohn- u. Geschäftshaus Düsseldorf										**21.03.2001**	**21.05.2002**
Baustellenvorbereitung										19.03.2001	31.08.2001
	Erdleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Gas.....)	Leitungen orten		GM	D 152			BGV-A1 (VBG 1), BGV-A2 (VBG 4), Vorsch. der EVU		20.03.2001	19.04.2001
		Leitungen sichern		GM	D 152						
	Verkehr im Umfeld der Baustelle							- Straßenverkehrsordnung (StVO) - (RSA) f.d.Sicherung v.Arbeitsst.an Straßen		20.03.2001	23.05.2002
Baustelleneinrichtung										03.04.2001	20.04.2001
	Baustellensicherung	Türen und Tore						BGV-A1 (VBG 1), Baustellenordnung		03.04.2001	07.05.2002
		Bauzaun									
	Baugeräte	Standsicherheit		GM	B 47			BGV-D6 (VBG 9), VBG 112	Kunze GmbH, Weiderweg 1, 47... Musterstadt, Herr Kaiser, 0172.....	03.04.2001	07.05.2002
	Baustellenverkehr	Baustelleneinrichtung mit Verkehrszeichenplan						BGV-A1 (VBG 1), Baustellenordnung	Kunze GmbH, Weiderweg 1, 47... Musterstadt, Herr Kaiser, 0172.....	03.04.2001	07.05.2002
	Brandschutz	Handfeuerlöscher		GM	A 105			BGV-A1 (VBG 1), "Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern" (ZH 1/201)	alle Firmen	03.04.2001	07.05.2002
	Entsorgung	Abwasser - Tank						BGV-A1 (VBG 1), Baustellenordnung	alle Firmen	03.04.2001	07.05.2002
		Abfallwirtschaft									
	Sozialeinrichtungen	Tagesunterkünfte		GM	A 173		B01	BGV-A1 (VBG 1), Arbeitsstättenverordnung Arbeitsstättenrichtlinien, VBG 109	alle Firmen	03.04.2001	07.05.2002
		Sanitäranlagen		GM	A 173						
	Versorgung	Strom - vom Netz	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel Prüfung (E-Verteiler) BGV A2 §5 (VBG 4) und DIN VDE 0100 - 0200.Durch eine Elektrofachkraft o. elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Meß-und Prüfgeräte sind diese 1 x im Monat zu überpüfen. Die Ergebnisse sind schriftlich zu dokumentieren.				B02	BGV-A1 (VBG 1), BGV-D34, BGV-A2 (VBG 4), VDE-Bestimmungen, Druckbehlv	Hochbau	03.04.2001	07.05.2002
		Wasser - vom Netz		BM	01.2.5						
				BM	01.2.6						
				StLB000	16003						
		Telefon		StLB000	16004						
		Funktelefon									
		Fax									
Verbauarbeiten										15.05.2001	07.06.2001
	Baugruben	Baugruben verbaut		GM	D 147			BGV-C22 (VBG 37),DIN 4124 "Baugruben und Gräben"	Fritsche GmbH	15.05.2001	07.06.2001
	Zugang in die Baugrube	Treppentürme						BGV-C22 (VBG 37), BGV-D36 (VBG 74)	Kunze GmbH, Weiderweg 1, 47... Musterstadt, Herr Kaiser, 0172.....	15.05.2001	07.06.2001
		Bautreppe									
Injektionsarbeiten										04.06.2001	21.06.2001
Erdarbeiten										17.04.2001	27.04.2001
	Baugruben	Baugruben verbaut		GM	D 147			BGV-C22 (VBG 37), DIN 4124 "Baugruben und Gräben"		17.04.2001	04.05.2001
	Zugang in die Baugrube	Bautreppe						BGV-C22 (VBG 37), BGV-D36 (VBG 74)	Kunze GmbH, Weiderweg 1, 47... Musterstadt, Herr Kaiser, 0172.....	17.04.2001	04.05.2001
	Hochgelegene Arbeitsplätze/Verkehrswege an Baugruben und Gräben	Seitenschutz				S30		BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste", Arbeitsstättenverordnung	Kunze GmbH, Weiderweg 1, 47... Musterstadt, Herr Kaiser, 0172.....	17.04.2001	04.05.2001
Rohbauarbeiten										17.04.2001	31.12.2001
	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Seitenschutz		GM	C 8	S21		BGV-C22 (VBG 37),SR für Auffangnetze (ZH 1/560), DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"	Bauleitung	17.04.2001	31.12.2001
		Arbeitsgerüste					B04				
		Fanggerüst		GM	C 9						
	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Vorgebaute Gerüstfelder mit innenliegendem Leitergang		BM	01.4.4	S21		BGV-C22 (VBG 37), BGV-D36 (VBG 74)	Kunze GmbH, Weiderweg 1, 47... Musterstadt, Herr Kaiser, 0172.....	17.04.2001	31.12.2001
				BM	01.4.5						
		Anlegeleitern		GM	C 23						
	Wandöffnungen	Seitenschutz		GM	C 8	S21		BGV-C22 (VBG 37), Arbeitsstättenverordnung DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"		17.04.2001	31.12.2001
	Bodenöffnungen	Umwehrungen				S30		BGV-C22 (VBG 37), SR für Auffangnetze (ZH 1/560) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"		17.04.2001	31.12.2001
		Abdeckungen				S07					
	Montage Fertigteile Krane	Montageanweisung						BGV-C22 (VBG 37), VBG 74, SR für Auffangnetze (ZH 1/560), DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste" - Montageanweisung	Robaufirma	17.04.2001	31.12.2001
	Schalungen	Lehrgerüste		GM	C 177			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37)		17.04.2001	31.12.2001
		Stellplätze									
	Schächte (vertikal)	Seitenschutz		GM	C 8	S21		BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"		17.04.2001	31.12.2001
	Schweißen	Lüftung		GM	D 31			BGV-D1, BGV-A4 , BGV-A8, BGV-D34, Druckbehälterverordnung		17.04.2001	31.12.2001
		Persönliche Schutzausrüstung		GM	D 21						
				GM	A 108						
		Brandschutz		GM	D 31						
Installationsarbeiten; Metallarbeiten, Schlosserarbeiten										04.09.2001	14.01.2002
Zimmer- / Holzbauarbeiten										03.12.2001	14.12.2001
	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Seitenschutz		GM	C 8	S21		BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste" SR f. hochziehbare Personenaufnahmem.(ZH 1/461)	Zimmermann / Dachdecker	03.12.2001	14.12.2001
		Arbeitsgerüst				S04					
		Dachfanggerüst				S10					
	Treppenläufe	Seitenschutz		GM	C 8	S22		- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37)		03.12.2001	14.12.2001
	Wandöffnungen	Seitenschutz		GM	C 8	S21		BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420		03.12.2001	14.12.2001
	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Vorgebaute Gerüstfelder mit innenliegendem Leitergang		BM	01.4.4			BGV-C22 (VBG 37), BGV-D6 (VBG 9),BGV-D36 (VBG 74)		03.12.2001	14.12.2001
				BM	01.4.5						
		Anlegeleitern		GM	C 23						
	Bodenöffnungen/Dachöffnungen	Umwehrungen		GM	C 8	S30		BGV-C22 (VBG 37)		03.12.2001	14.12.2001
		Abdeckungen				S07					
Dachdeckungsarbeiten										17.12.2001	31.01.2002
	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Seitenschutz		GM	C 8	S21		BGV-C22 (VBG 37), SR für Auffangnetze (ZH 1/560)		17.12.2001	31.01.2002
		Arbeitsgerüst				S04					
		Dachfanggerüst				S10					
Einbau Fenster										02.01.2002	31.01.2002
	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Seitenschutz		GM	C 8	S21		BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420		02.01.2002	31.01.2002
		Arbeitsgerüste									
Wärmeverbundsystem										02.02.2002	28.02.2002
	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Seitenschutz		GM	C 8	S21		BGV-C22 (VBG 37) DIN 4420		02.02.2002	28.02.2002
		Arbeitsgerüste									
	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Vorgebaute Gerüstfelder mit innenliegendem Leitergang		BM	01.4.4	S21		BGV-C22, BGV-D36 (VBG 74), VBG 14, BGV-D6		02.02.2002	28.02.2002
				BM	01.4.5						
		Anlegeleitern		GM	C 23						
Innenausbau										02.01.2002	30.05.2002
	Arbeiten in engen Räumen	Belüftungsanlage		GM	D 35			BGV-C22 (VBG 37), BGV-A4		02.01.2002	30.05.2002
	Bodenöffnungen	Abdeckungen				S07		BGV-C22 (VBG 37),DIN 4420		02.01.2002	30.05.2002
	Gefährliche Arbeitsstoffe	Ersatzstoffe						BGV-A1 , BGV-D26, VBG119,VBG 113, VBG23, VBG125, VBG100, Gefahrstoffverordnung		02.01.2002	30.05.2002
		GISBAU									
	Wandöffnungen	Seitenschutz		GM	C 8	S21		BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420		02.01.2002	30.05.2002
	Schächte (vertikal)	Seitenschutz		GM	C 8	S21		BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420		02.01.2002	30.05.2002
Außenanlagen										01.05.2002	30.05.2002
			Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen								
		Arbeitsgerüst				S04				03.12.2001	31.01.2002
		Bodenabdeckungen				S07				17.04.2001	30.05.2002
		Dachfanggerüst				S10				03.12.2001	31.01.2002
		Seitenschutz				S21				17.04.2001	30.05.2002
		Seitenschutz für Treppen				S22				03.12.2001	14.12.2001
		Umwehrung				S30				17.04.2001	31.12.2001
			Gemeinsam genutzte Betriebseinrichtungen								
Baustelleneinrichtung	Sozialeinrichtungen	Baustellen-Elektroverteiler		GM	A 173		B01	BGV-A1 (VBG 1), Arbeitsstättenverordnung Arbeitsstättenrichtlinien, VBG 109	alle Firmen	17.04.2001	21.05.2002
Rohbauarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Sanitäreinrichtung					B04	BGV-C22 (VBG 37),SR für Auffangnetze (ZH 1/560), DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"	Bauleitung	17.04.2001	31.12.2001
Baustelleneinrichtung	Versorgung	Turmdrehkran	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel Prüfung (E-Verteiler) BGV A2 §5 (VBG 4) und DIN VDE 0100 - 0200 Durch eine Elektrofachkraft o. elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Meß-und Prüfgeräte sind diese 1 x im Monat zu überpüfen. Die Ergebnisse sind schriftlich zu dokumentieren.				B02	BGV-A1 (VBG 1), BGV-D34, BGV-A2 (VBG 4), VDE-Bestimmungen, Druckbehlv	Hochbau	17.04.2001	21.05.2002

Persönliche Schutzausrüstung

Personen ohne Schutzhelm und Sicherheitsschuhe haben keinen Zutritt zum unmittelbaren Baustellenbereich.

Schutzhelm tragen

Sicherheitsschuhe tragen

Bei entsprechenden Gefährdungen und Belastungen zusätzliche Schutzausrüstung benutzen:

Schutzbrille benutzen

Handschutz benutzen

Gehörschutz benutzen

Gesichtsschutz benutzen

Auffanggurt anlegen

Schutzkleidung benutzen

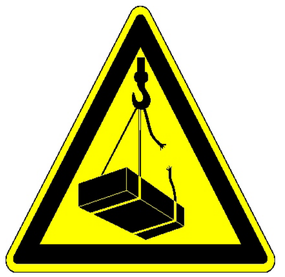

Bauherr:	Mustermann Karl Weidenweg 1 47... Musterstadt
Baustelle:	05001 - Wohn- u. Geschäftshaus, Düsseldorf Kurzestr. 5 - 7 40477 Düsseldorf
Sigeplan	
Planfertiger/Koordinator:	Karl Muster
Datum/Unterschrift:	06.04.2002
Plannr.:	1
Index:	
